

四川能投发展)就 2022

工

工

组织竞

判, 欢迎符合本项目资格条

件的潜在响应人参与谈判。

一、项目概况

(一) 项目名称

四川能投发展股份有限公司 2022 年第一批自有资金工程竣

工验收项目(含工程验收项目)及工程验收项目(含工程验收项目)

一、项目概况

1. 项目名称: 四川能投发展股份有限公司 2022 年第一批自有资金工程竣工验收项目

2. 项目编号: [REDACTED]

3. 项目地点: [REDACTED]

4. 项目内容: [REDACTED]

5. 项目预算: [REDACTED]

6. 项目工期: [REDACTED]

7. 项目其他: [REDACTED]

(二) 被审项目工程明细

一、项目概况

1. 项目名称: [REDACTED]

2. 项目编号: [REDACTED]

3. 项目地点: [REDACTED]

4. 项目内容: [REDACTED]

5. 项目预算: [REDACTED]

6. 项目工期: [REDACTED]

7. 项目其他: [REDACTED]

兴文县共乐 35kv 变电站综 自改造工程	149.84	2020/10/20	138.00
2020 年生产类预算低电压 台区改造项目	122.69	2020/06/25	122.69
35KV 回龙变电站增容改造 工程 EPC 总承包合同工程	667.00	2020/07/28	629.18
兴文县莲花变电站-园区万 民路 10kv 线路新建工程	492.21	2020/12/18	378.10
	125.63	2020/12/18	
	258.00	2021/04/16	
	289.00	2021/05/16	264.23
		2021/04/30	159.08
金光 3、4 线#13 杆至花山 公园西南角配电网改造 工程	157.00	2021/04/30	139.75
光明新城 K6 开闭所电缆下 地工程		2021/04/30	232.17 330.13
35kv 梵王山变电站综自系 统改造工程	177.00	2020/12/17	348.78
35kv 九丝变电站综自系统 改造工程			
35kv 光明变电站技改工程	399.00	2020/08/01	
		2020/08/01	316.50
		2020/12/01	

安装工程			
2020“双覆盖”(城区、景阳、双腾、巡司)表计安装工程	395.78	2020/12/01	395.78
筠连县 35kV 海瀛变电站 2#			

主变扩建工程

35KV 云森线升压技改工程 460.00 2019/06/01 311.19

(三) 资金来源

由各项目业主单位承担，审计费用按照金额比例由各项目业主分摊

(四) 审计工作内容

根据四川能投发展股份有限公司委托事项和要求，完成审计服务工作（详见竞争性谈判文件第三章）

(五) 审计要求

1. 工程结算审计要求

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《建设工程项目工程结算编审规程》

公司《基本建设工程项目内部审计管理办法（试行）》（川能投〔2021〕1046号）和四川能投发展股份有限公司《基本建设工程项目内部审计管理办法（试行）》（川能投股〔2022〕207号）

管相关报审。四川能投发展股份有限公司内部审计部。应就以上
[REDACTED]

进行审计,对工程项目实际造价及建设成果发表审计意见。具体审计要求如下:

(1) 工程竣工结算原始资料真实性、完备性、合法性、有效性的审计。

①是否按每个单项工程整理一套完整有效的竣工图纸。亦即
[REDACTED]

设计审批、施工图审查、专项方案审批、竣工验收备案

[REDACTED]

④ 建设工程质量监督站是否按规定进行质量监督、竣工验收备案

[REDACTED]

整。

⑥ 工程质量监督站在工程验收时所需的所有资料是否完整、真实、合法、有效；是否通过相关建设行政主管部门的验收。

[REDACTED]

(3) 工程竣工结算书审计

① 工程竣工结算书审计应遵循以下原则：(1) 合法性原则：结算书的内容应符合国家法律法规及合同约定。(2) 真实性原则：结算书的数据应真实可靠，不得虚报、瞒报。(3) 完整性原则：结算书应完整反映工程的全部费用。(4) 及时性原则：结算书应在规定时间内编制和审核。(5) 公正性原则：审计过程应公正、公平、公开。

② 工程量的计算是否符合合同约定工程量计算规则，是否准确，有无重计、漏计等计算错误。

③ 承包人在投竣工结算书中所报的单价是否与投标文件所报的单价一致。因发包人原因要求 EPC 合同范围以外的设计变更时，

变更部分的单价应按合同约定执行。如合同中没有约定，应按市场价或双方协商确定。

体要求:

(1) 电力建设工程投资审计

① 电力建设工程是否按计划完成。

② 电力建设工程投资是否真实、完整，有无虚列投资、有无计划外工程等。



有利于扩大开支范围，提高开支标准等现象。是否与概算或财务

管理规定相符。


②筹融资费用是否合规，借款费用资本化是否符合会计准则

是否相符

③征地拆迁补偿费、勘察设计费、研究试验费、工程咨询费、中介服务费等是否真实合规，有无擅自提高计费标准的问题；相

关工作成本费用是否与合同约定相符

③ 此而此此、此此此此此此、此此此 日丁 十上日行此

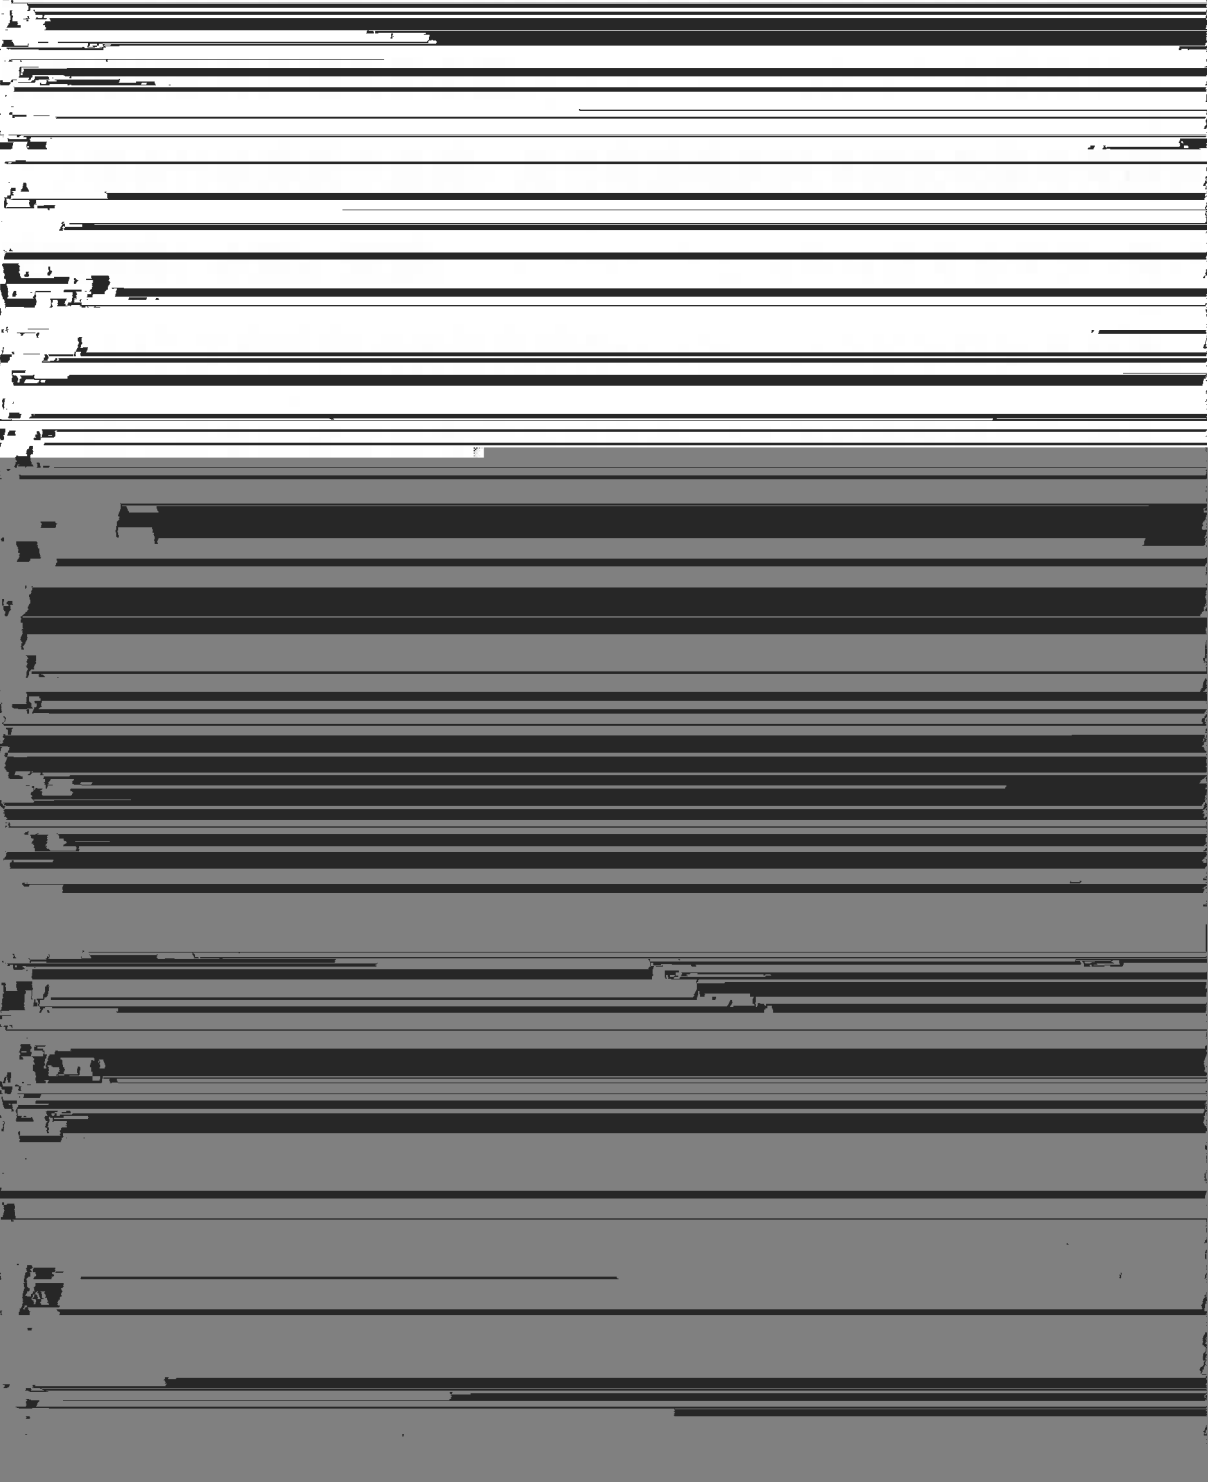

④ △此此此此目不此此 目不此此此此此此又此此此此此此此此此此



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

② 计划执行情况

[REDACTED]

审核投资计划执行情况。实际建设规模、标准、内容与批准

[REDACTED]

表管理体系，各种监理报表是否做到体系化、规范化、标准化。

审核是否按照合同相关约定完成相关服务或审核工作。

书;

(4) 担任西口名主、可儿十和什筋内、左主、书十和拾十副

[REDACTED]

务决算审计负责人之一。

3. 业绩要求

[REDACTED]

(4) 商业伙伴合规审查资料(详见附件)要求提供的相应资

料

前 3 项资料分开存放。

2. 获取领取文件方式: 网上获取方式。

拟参与本项目的响应人在规定时间内按要求将需提供的资料扫描盖章后发至邮箱(ztbzx@scntgf.com), 待所发邮件资料审查通过后, 四川能投发展将本次竞争性谈判文件发送至该响应人联系邮箱。

四、谈判响应文件递交截止时间及地点

1. 谈判响应文件递交的截止时间为 2022 年 7 月 19 日 10 时

采购人：四川能投发展股份有限公司

地址：四川省成都市温江区人和路 789 号四川省水电集团大
楼 3 楼

联系人：李女士

联系电话：028-86299782/18227551086

2022 年 7 月 4 日
